

杭州临安艾康生物技术有限公司年产20亿人份体外诊断试剂项目（二期）竣工环境保护先行验收意见

2026年01月16日，建设单位杭州临安艾康生物技术有限公司根据《杭州临安艾康生物技术有限公司年产20亿人份体外诊断试剂项目（二期）竣工环境保护先行验收监测报告表》，并对照《建

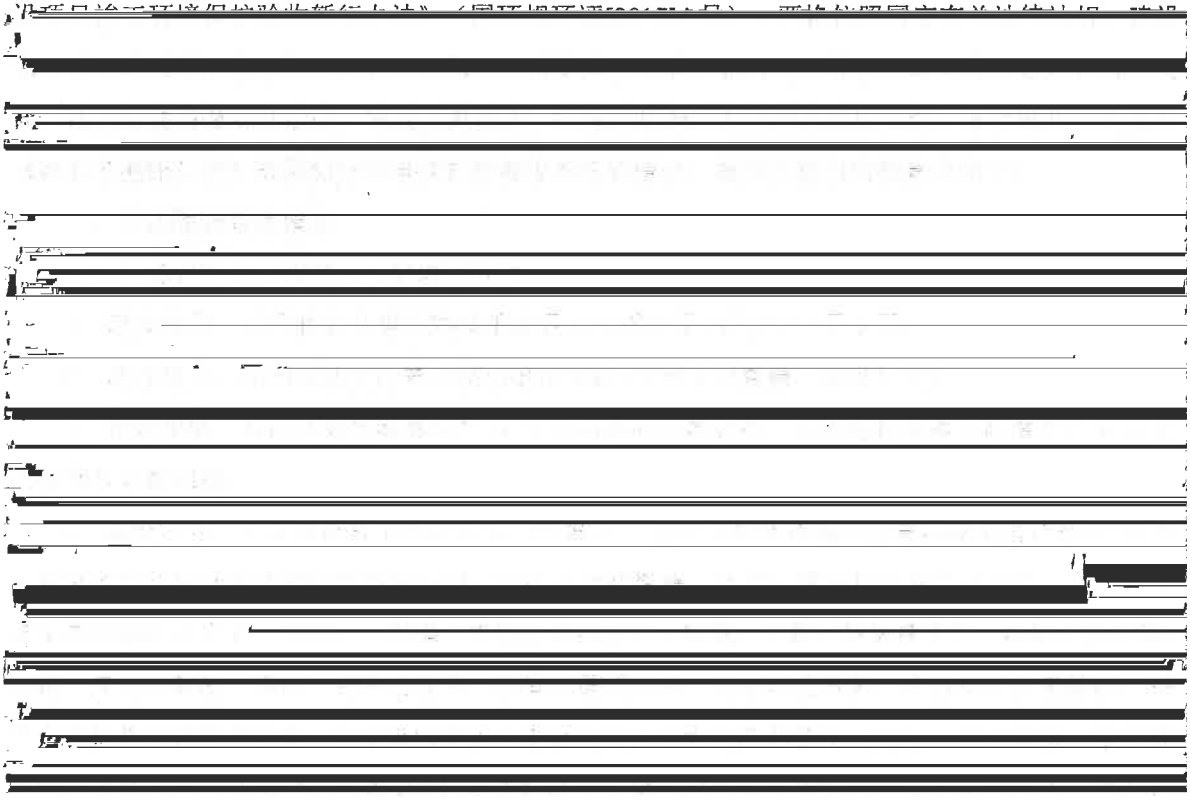

断试剂。

（二）建设过程及环保审批情况

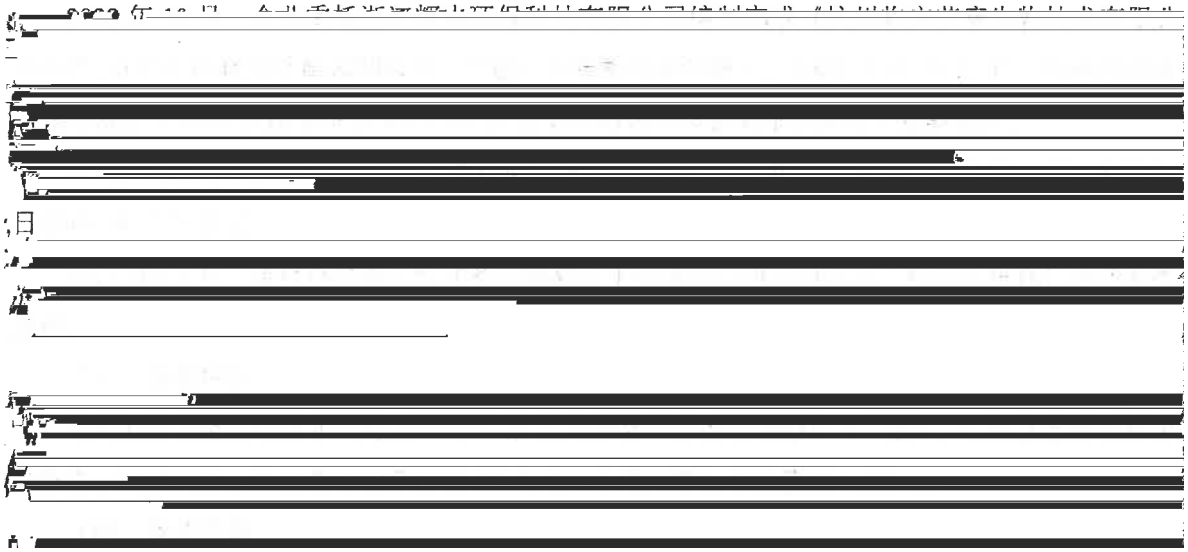

日

本次验收为先行验收，验收范围为年产 1.53 亿人份体外诊断试剂。对应的文号为杭临环评备 2022-29 号。验收内容主要包括环保设施落实情况、污染物达标排放及总量控制情况。

二、工程变动情况



（1）环评审批中 A 厂区（环球）废气排气筒高度为 25m，实际高度为 38m；

（2）环评审批中企业在切割工序（本项目新增切割机 3 台、数控裁切机 1 台）上方安装顶吸罩进行收集，粉尘经收集后由引风机通过布袋除尘器处理，尾气经 25m 高排气筒（DA001）高空排放；实际切割工序未建设；

（3）环评审批中，本次扩建项目艾康公司 4 个厂区的产能分布情况为：生产工艺中的前道工序均放在 A 厂区（环球），即 20 亿人份/年体外诊断试剂的前道工序均在 A 厂区（环球）生产，前道工序包括试纸生产、粘膜、切割、裂解液生产、纸材子生产等，后道工序（装配、喷码、包装检验

【污染防治措施】

企业在 A 厂区喷码车间、打码车间采用整体换风密闭负压收集的措施，生产时关闭车间窗户，进出口设垂地软帘，车间顶部正对喷码机上方设置风管对车间进行抽风，并将废气收集后采用二级活性炭净化处置后经 38m 排气筒（DA001）高空排放。

（三）噪声

[redacted]

噪声源强。


（四）固废

本次验收部分固体副产物主要为 A 厂区产生的副产物主要有废包装材料、边角料及废次品、粉尘、

[redacted]

1、废水

监测期间，园区总排口符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，即：pH

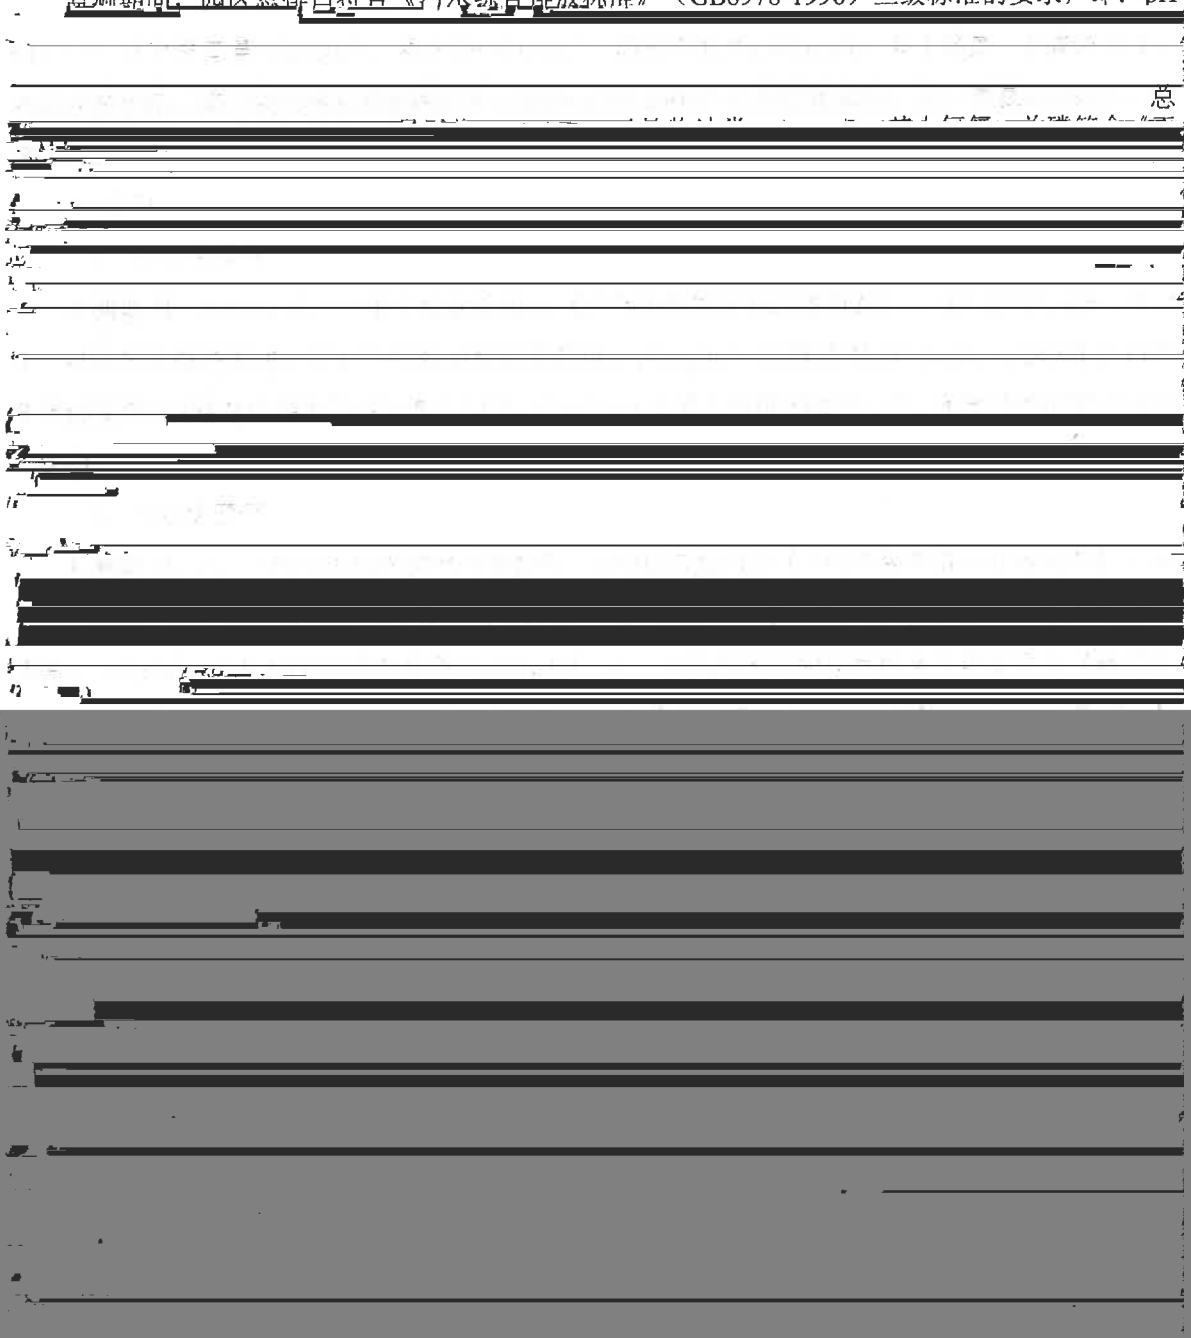

业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中限值的要求，即：氨氮≤35mg/L，磷≤8mg/L。

2、废气

（1）有组织废气

监测期间，DA001 出口中非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值的要求，即：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m^3，排放速率≤45.3kg/h。DA001 出口中

颗粒物排放量为 1.069t/a）。

五、工程建设对环境的影响

项目环境影响报告表及批复意见中并未对环境敏感保护目标要求进行环境质量监测，根据项目验收监测结果分析可知，项目废水、废气及噪声均可达标排放、固废妥善处置，对周边环境影响不大。

六、验收结论


依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州临安艾康生物技术有限公司年产 20 亿人份

八、验收组人员信息

详见验收小组人员签到单。

临安艾[redacted]物技[redacted]有 公司

026 16 日

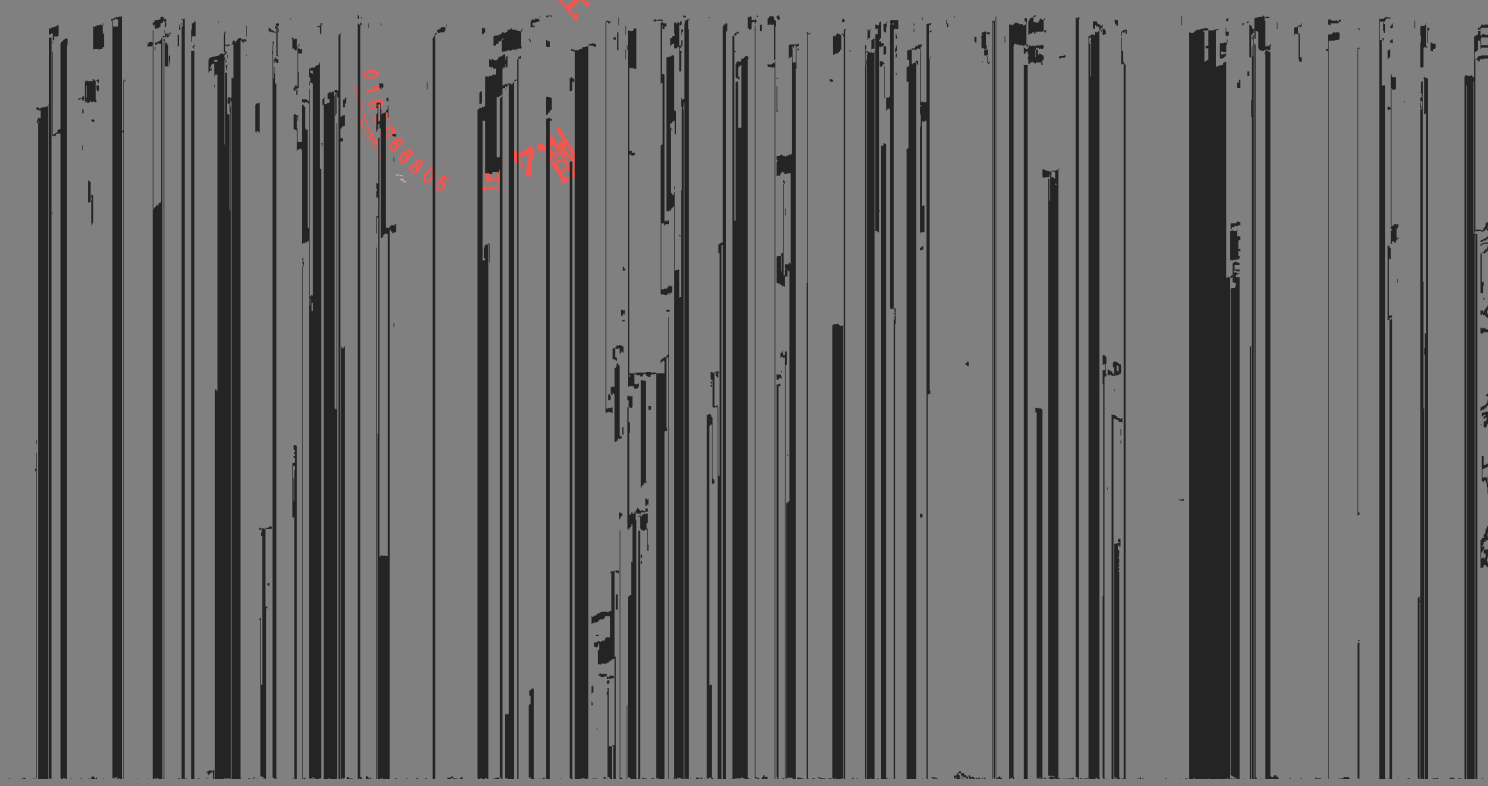

目（二期）

务/职称	电　话
工程师	13148335737
矿	18 671 844
长	18258148 24
员	18268030391
